



FOR NUBO

누보 AI 의사결정 지원 시스템 구축 제안서

더존 ERP와 외부 시황 정보를 함께 보고, 판매·구매·생산 판단을 더 빠르고 일관되게 할 수 있도록 돕는 시스템 제안입니다.

수신 주식회사 누보

제안 플럭 · 황성안 · 심재형

CONTACT hello@pluck.co.kr 📧 메일 보내기

01. 개요

제안 개요

이번 제안의 핵심은 AI 자체가 아니라, 누보가 더 빨리 비교하고 더 쉽게 합의할 수 있는 판단 도구를 만드는 것입니다.

핵심 목표

결정 속도 개선

국내·해외·B2B·생산 부서의 상충되는 의견을 수치와 근거로 빠르게 정리합니다.

핵심 방법

자료 정리 + 비교 기준 + 쉬운 설명

흩어진 자료를 한곳에 모으고, 비교 기준을 만들고, 결과를 이해하기 쉬운 문장과 화면으로 보여줍니다.

핵심 원칙

최종 판단은 사람

AI는 추천·비교·설명을 담당하고, 최종 승인과 실행 판단은 누보가 보유합니다.

1차로는 누보 내부 데이터를 기준으로 판매, 구매, 생산 판단을 돕는 핵심 화면을 구축하고, 이후 필요에 따라 외부 시황 정보 연계와 추가 자동화로 넓혀가는 방식입니다.

02. 배경

프로젝트 배경 및 문제 정의

미팅에서 확인된 주요 현안을 네 가지로 정리했습니다.

현업 이슈

- 동일 제품이라도 국내·해외·B2B·생산 부서별 우선순위가 상이함
- 손익 기준으로 어느 채널에 우선 배분할지 신속한 합의가 어려움
- 원료 구매 시점 판단이 개인 경험에 크게 좌우될 수 있음

데이터 이슈

- 데이터는 더존 ERP에 있지만, 바로 판단에 쓰기에는 먼저 정리 작업이 필요함
- 지역·조직 변경 이력 때문에 코드와 기준을 먼저 통일해야 함
- 활용 가능한 과거 데이터 범위는 2013~2026년으로 확인됨

의사결정 이슈

- 판매계획, 실적, 구매, 생산 계획이 연쇄적으로 연결됨
- 전체 흐름을 함께 보아야 합리적인 배분 및 구매 판단이 가능함

- 현재는 여러 자료를 한 번에 비교해볼 수 있는 통합 화면이 부족함

외부 변수

- 전쟁, 중국 정책, 물류, 환율 등 외부 요인이 원료 구매 적기에 큰 영향을 미침
- 국제 시황 자료는 내부 가격 정보와 함께 봐야 실질적인 판단이 가능함
- 하나의 정답을 맞히는 것보다 여러 시나리오를 비교하는 방식이 더 실무적임

플렉은 이렇게 일합니다

누보가 걱정할 수 있는 부분을 줄이고, 실제로 확인하면서 진행하는 방식으로 프로젝트를 수행합니다.

01 단계별로 확인하며 진행합니다

각 단계 결과를 함께 확인한 뒤 다음 단계로 넘어갑니다. 큰 계약만 먼저 하고 나중에 확인하는 방식이 아닙니다.

02 실제로 쓰는 화면을 만듭니다

기술 설명보다 회의와 운영 현장에서 바로 사용할 수 있는 화면과 결과물을 만드는 데 집중합니다.

03 최종 결정은 누보가 합니다

시스템은 비교와 추천을 돕지만, 발주·배분 같은 중요한 결정은 반드시 누보가 직접 승인하도록 구성합니다.

04 한 업체에 묶이지 않게 합니다

운영 자료와 권한이 누보에 남도록 구성해, 담당 업체가 바뀌어도 계속 운영할 수 있게 합니다.

04. 범위

제안 범위

1차 구축 범위는 실제 의사결정에 바로 활용할 수 있는 핵심 기능에 집중합니다.

1차 핵심 범위

내부 의사결정 지원

- 판매 계획 대비 실적 분석
- 지역·채널·사업부 기준 손익 비교
- 구매 실적·계획과 생산 계획의 연계 분석
- 배분 우선순위 추천 및 근거 설명

화면 및 운영 범위

의사결정 회의 보조 화면


- 현재 재고와 판매 방향 요약
- 배분 추천안과 기회손실 비교
- 추천 이유를 쉬운 문장으로 설명
- 사람 승인 전제의 검토 절차

외부 현황 정보 연계, 반복 업무 자동화, 신규 사업 확장 과제는 1차 범위에 포함되지 않으며, **1차 성과 확인 이후 별도 후속 과제로 다룹니다** (자세한 내용은 「확장 과제」 슬라이드 참조).

단계별 일정 · 산출물 · 금액

각 단계를 확인하고 넘어가는 방식으로 진행해 일정과 품질을 안정적으로 관리합니다.

전체 흐름 (최소 28주 / 6개월 이상)

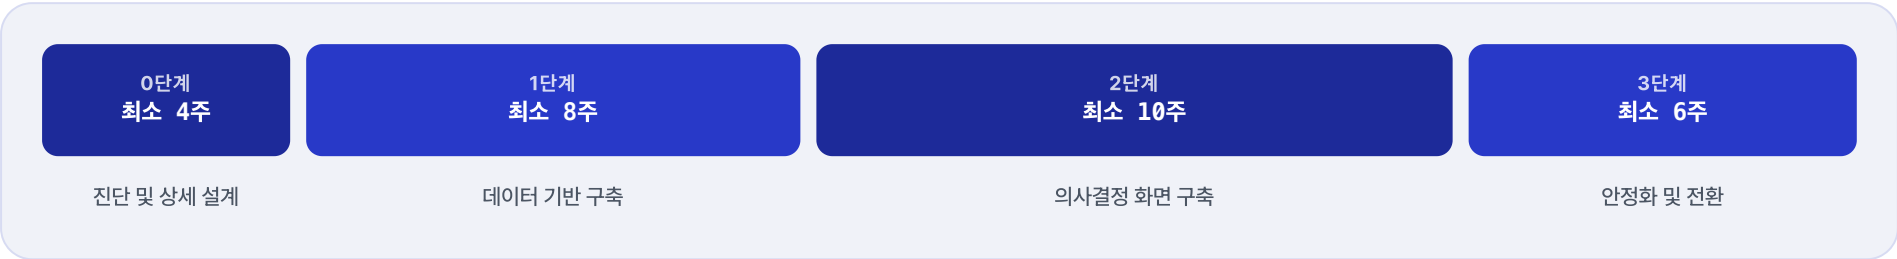

단계	기간	주요 산출물	검수 포인트	금액
0단계 — 진단 및 상세 설계	최소 4주	데이터 진단서, 핵심 판단 기준서, 코드 정리 계획, 구축 명세서	범위 확정 · 다음 단계 승인	10,000,000 ~ 15,000,000원
1단계 — 데이터 기반 구축	최소 8주	분석용 데이터 정리, 기준 테이블, 기본 현황 화면	데이터 정합성 · 조회 정확성 검수	40,000,000 ~ 60,000,000원
2단계 — 의사결정 화면 구축	최소 10주	배분 추천 화면, 손익 비교, 설명 기능, 승인 흐름 초안	회의 활용성 · 추천 결과 검토	35,000,000 ~ 55,000,000원
3단계 — 안정화 및 전환	최소 6주	권한 · 감사 로그 · 운영 문서 · 교육 자료	운영 준비 완료 · 종료 승인	15,000,000 ~ 25,000,000원

단계	기간	주요 산출물	검수 포인트	금액
1차 합산 계약 합계	최소 28주	단계별 검수 통과 후 다음 단계로 진입		100,000,000 ~ 155,000,000원 최소 1.0억 ~ 표준 1.55억 · 부가세 별도

06. 진행 방식

협업 방식에 따른 3가지 진행안

구축 내용은 같고, 차이는 현장 참여 방식과 이에 따른 총 비용입니다.

1안

전면 원격

필요한 경우 방문을 병행하는 방식

9,500만 ~ 1.4억

출장·체류 부담 없음

누보 추가 부담

없음

- 현장 출입 부담 없음
- 화상 회의 중심, 월 1~2회 방문
- 현장 이해 속도는 상대적으로 느릴 수 있음

2안

일부 현장 협업

1명 기준, 주 2~3일 현장 참여

1.0억 ~ 1.55억

출장·체류 일부 포함 (표준 건적)

누보 추가 부담

사무 1석

- 회의 참여와 피드백 반영이 빠름
- 비용과 실행 효율의 균형이 우수함
- 본 제안서의 기본 가정

3안

전면 현장 협업

두 인력 모두 누보 현장 중심으로 참여

1.1억 ~ 1.7억

출장·체류 풀 반영

누보 추가 부담

사무 2석

- 가장 빠른 진행과 즉각 대응이 가능함
- 다부서 협의가 필요한 경우 유리함
- 현장 이해도 확보 속도가 가장 빠름

핵심 차이

세 안 모두 구축 목표와 결과물은 같지만, 현장 참여 수준이 높아질수록 출장·체류와 운영 부담이 총 비용에 반영됩니다. 누보 입장에서는 **속도와 비용의 균형**을 기준으로 선택하시면 됩니다.

어느 안을 선택하더라도 단계별 검토 방식과 후속 확장 구조는 동일하게 유지됩니다.

07. 옵션

추가 옵션 및 운영비

1차 구축 이후 선택 가능한 확장 항목과 운영 단계의 월 비용입니다.

선택 옵션

외부 시황 연계 확장

35,000,000원

부가세 별도 · 4~6주 추가

외부 시황 정보 연계, 구매 시점 비교, 외부 변수 반영 화면을 추가합니다.

운영 지원

월 운영 및 개선

2,000,000 ~ 12,000,000원

월 단위 · 강도별 별도 협의 · 부가세 별도

가벼운 유지보수부터 적극적인 개선·운영까지 누보의 사용 강도에 따라 범위와 비용을 합의합니다.

별도 부담 항목

클라우드 서버 비용, AI 사용료, 외부 시황 데이터 구독료는 누보 측 별도 부담입니다. 일반적으로 월 **300만~1,000만원 수준**에서 시작하며, 사용량과 연계 범위에 따라 변동됩니다.

누보 협조 사항·운영 원칙

안정적인 추진을 위해 누보 측 준비 사항과 공통 운영 원칙을 함께 정리했습니다.

누보 측 협조 사항

데이터 / 시스템

- 판매·구매·생산 계획 및 실적 샘플 데이터 (3~6개월치)
- 지역·사업부·채널 코드표 및 변경 이력
- 더존 테스트 계정 또는 시뮬레이션 환경
- 보안·반출 정책 사전 정의

업무 / 검수

- S&OP 회의 보고 자료 및 판단 기준
- 내부 진행 책임자 1명 지정
- 단계별 리뷰 회의 참여자 지정
- 중간 산출물 승인 절차 정의

공통 운영 원칙

사람 승인

- 추천 결과는 사람이 승인 후 실행
- 추천 사유와 사용 데이터를 화면에서 함께 확인
- 배분·구매 판단은 비교 중심으로 제공

소유권 이관

- 운영 자료와 설명 문서는 누보에 남도록 정리
- 관리자 계정과 운영 권한 이전 가능 구조
- 종료 또는 담당자 변경 시 인수인계 절차 포함

비용 통제

- 서버·AI 사용료·외부 데이터 비용 상한선 설정
- 업데이트 주기와 사용량 기준 사전 정의
- 외부 시황 연계는 1차 성과 확인 후 확장

09. 전략 기능

왜 누보에 AI 전담 기능이 필요한가

AI팀은 단순한 기술 조직이 아니라, 누보의 수익성 관리와 미래 사업 확장을 뒷받침하는 전략 실행 기능으로 볼 수 있습니다.

내부 역량 축적

판단 기준이 회사 안에 남습니다

외부 업체가 화면만 만들어주는 구조가 아니라, 누보 내부에 데이터 기준과 판단 방식이 계속 쌓이는 구조를 만들 수 있습니다.

수익성 관리 고도화

제품·채널·국가별 손익 대응이 빨라집니다

무엇을 먼저 팔고, 어디에 배분하고, 언제 사는 것이 유리한지 더 빠르게 비교할 수 있어 수익성 관리 체계가 한 단계 올라갑니다.

수출 확대 대응

해외 거래가 늘수록 전담 기능이 필요합니다

일본, 미국 등 해외 거래가 커질수록 가격, 공급, 일정 판단을 더 자주 해야 하므로 이를 지속적으로 관리할 내부 기능이 필요합니다.

기업가치 관점**미래 성장 체계에 대한 설명력이 생깁니다**

단순히 AI를 도입했다는 의미보다, 누보가 수익성 관리와 미래 사업 확장을 준비하고 있다는 점을 더 분명하게 설명할 수 있습니다.

누보의 AI 전담 기능은 비용 절감만을 위한 조직이 아니라, 수익성 관리 체계 고도화, 수출 확대 대응, 미래 사업 실행력 내재화를 위한 전략 실행 기능으로 설계될 수 있습니다.

10. 확장 과제

누보에 적합한 후속 프로젝트 10선

1차 구축 이후, 누보의 현재 사업 구조를 바탕으로 현실적으로 검토할 수 있는 후보 과제들입니다.

구매 · 수출 · 생산

01. 원료 구매 시점 판단

환율, 물류, 국제 상황을 함께 보고 원료를 언제 사는 게 유리한지 비교

02. 수출 국가별 손익 관리

국가·거래처·제품별 매출과 마진을 한눈에 비교하는 관리 화면

03. 생산·재고 최적화

판매 계획과 출하 일정에 맞춰 생산량과 재고 수준을 조정하는 체계

04. 제품별 수익성 계산

원가, 판매가, 물류비를 반영해 어떤 제품이 더 남는지 비교

05. 영업 견적 지원

작물, 지역, 시즌에 따라 추천 제품과 견적 초안을 빠르게 만드는 기능

운영 · 고객 · 경영

06. 해외 거래 진행 관리

계약, 발주, 생산, 선적 진행 상황을 한 번에 추적하는 관리 화면

07. 골프장 고객 관리

골프장별 제품 사용 이력과 관리 일정을 정리하는 고객 관리 시스템

08. 홈가드닝 고객 운영

가정원에 고객 대상 추천, 정기 구매, 리뷰 관리를 돕는 판매 지원 체계

09. 시험 데이터 정리 및 재사용

시험 포장과 작물 반응 데이터를 쌓아 다음 제품 개발에 다시 활용하는 체계

10. 경영 현황 한눈에 보기

비료, 수출, 골프장, 원예 사업 현황을 대표와 임원이 함께 보는 통합 화면

FINAL

감사합니다

이번 1차 구축의 목적은 흩어진 자료를 한곳에서 보고, 판매·구매·생산 판단을 더 빠르고 일관되게 할 수 있게 만드는 것입니다. 이후에는 수출, 생산, 고객 관리, 추가 자동화 영역으로 자연스럽게 확장할 수 있습니다.

1차 구축 초점

판매, 구매, 생산, 배분 판단을 하나의 흐름으로 연결해 회의와 운영에 바로 쓰는 화면 구축

확장 가능 영역

외부 정보 연계, 글로벌 수출, 고객 관리, 반복 업무 자동화까지 단계적으로 확장 가능

PLUCK

FAST · RELIABLE · DEVELOPMENT

hello@pluck.co.kr

✉ 메일 보내기

황성안 · 심재형

2026.04.27
